


保利东江首府一期高层洋房A1~A4栋施工总进度计划
















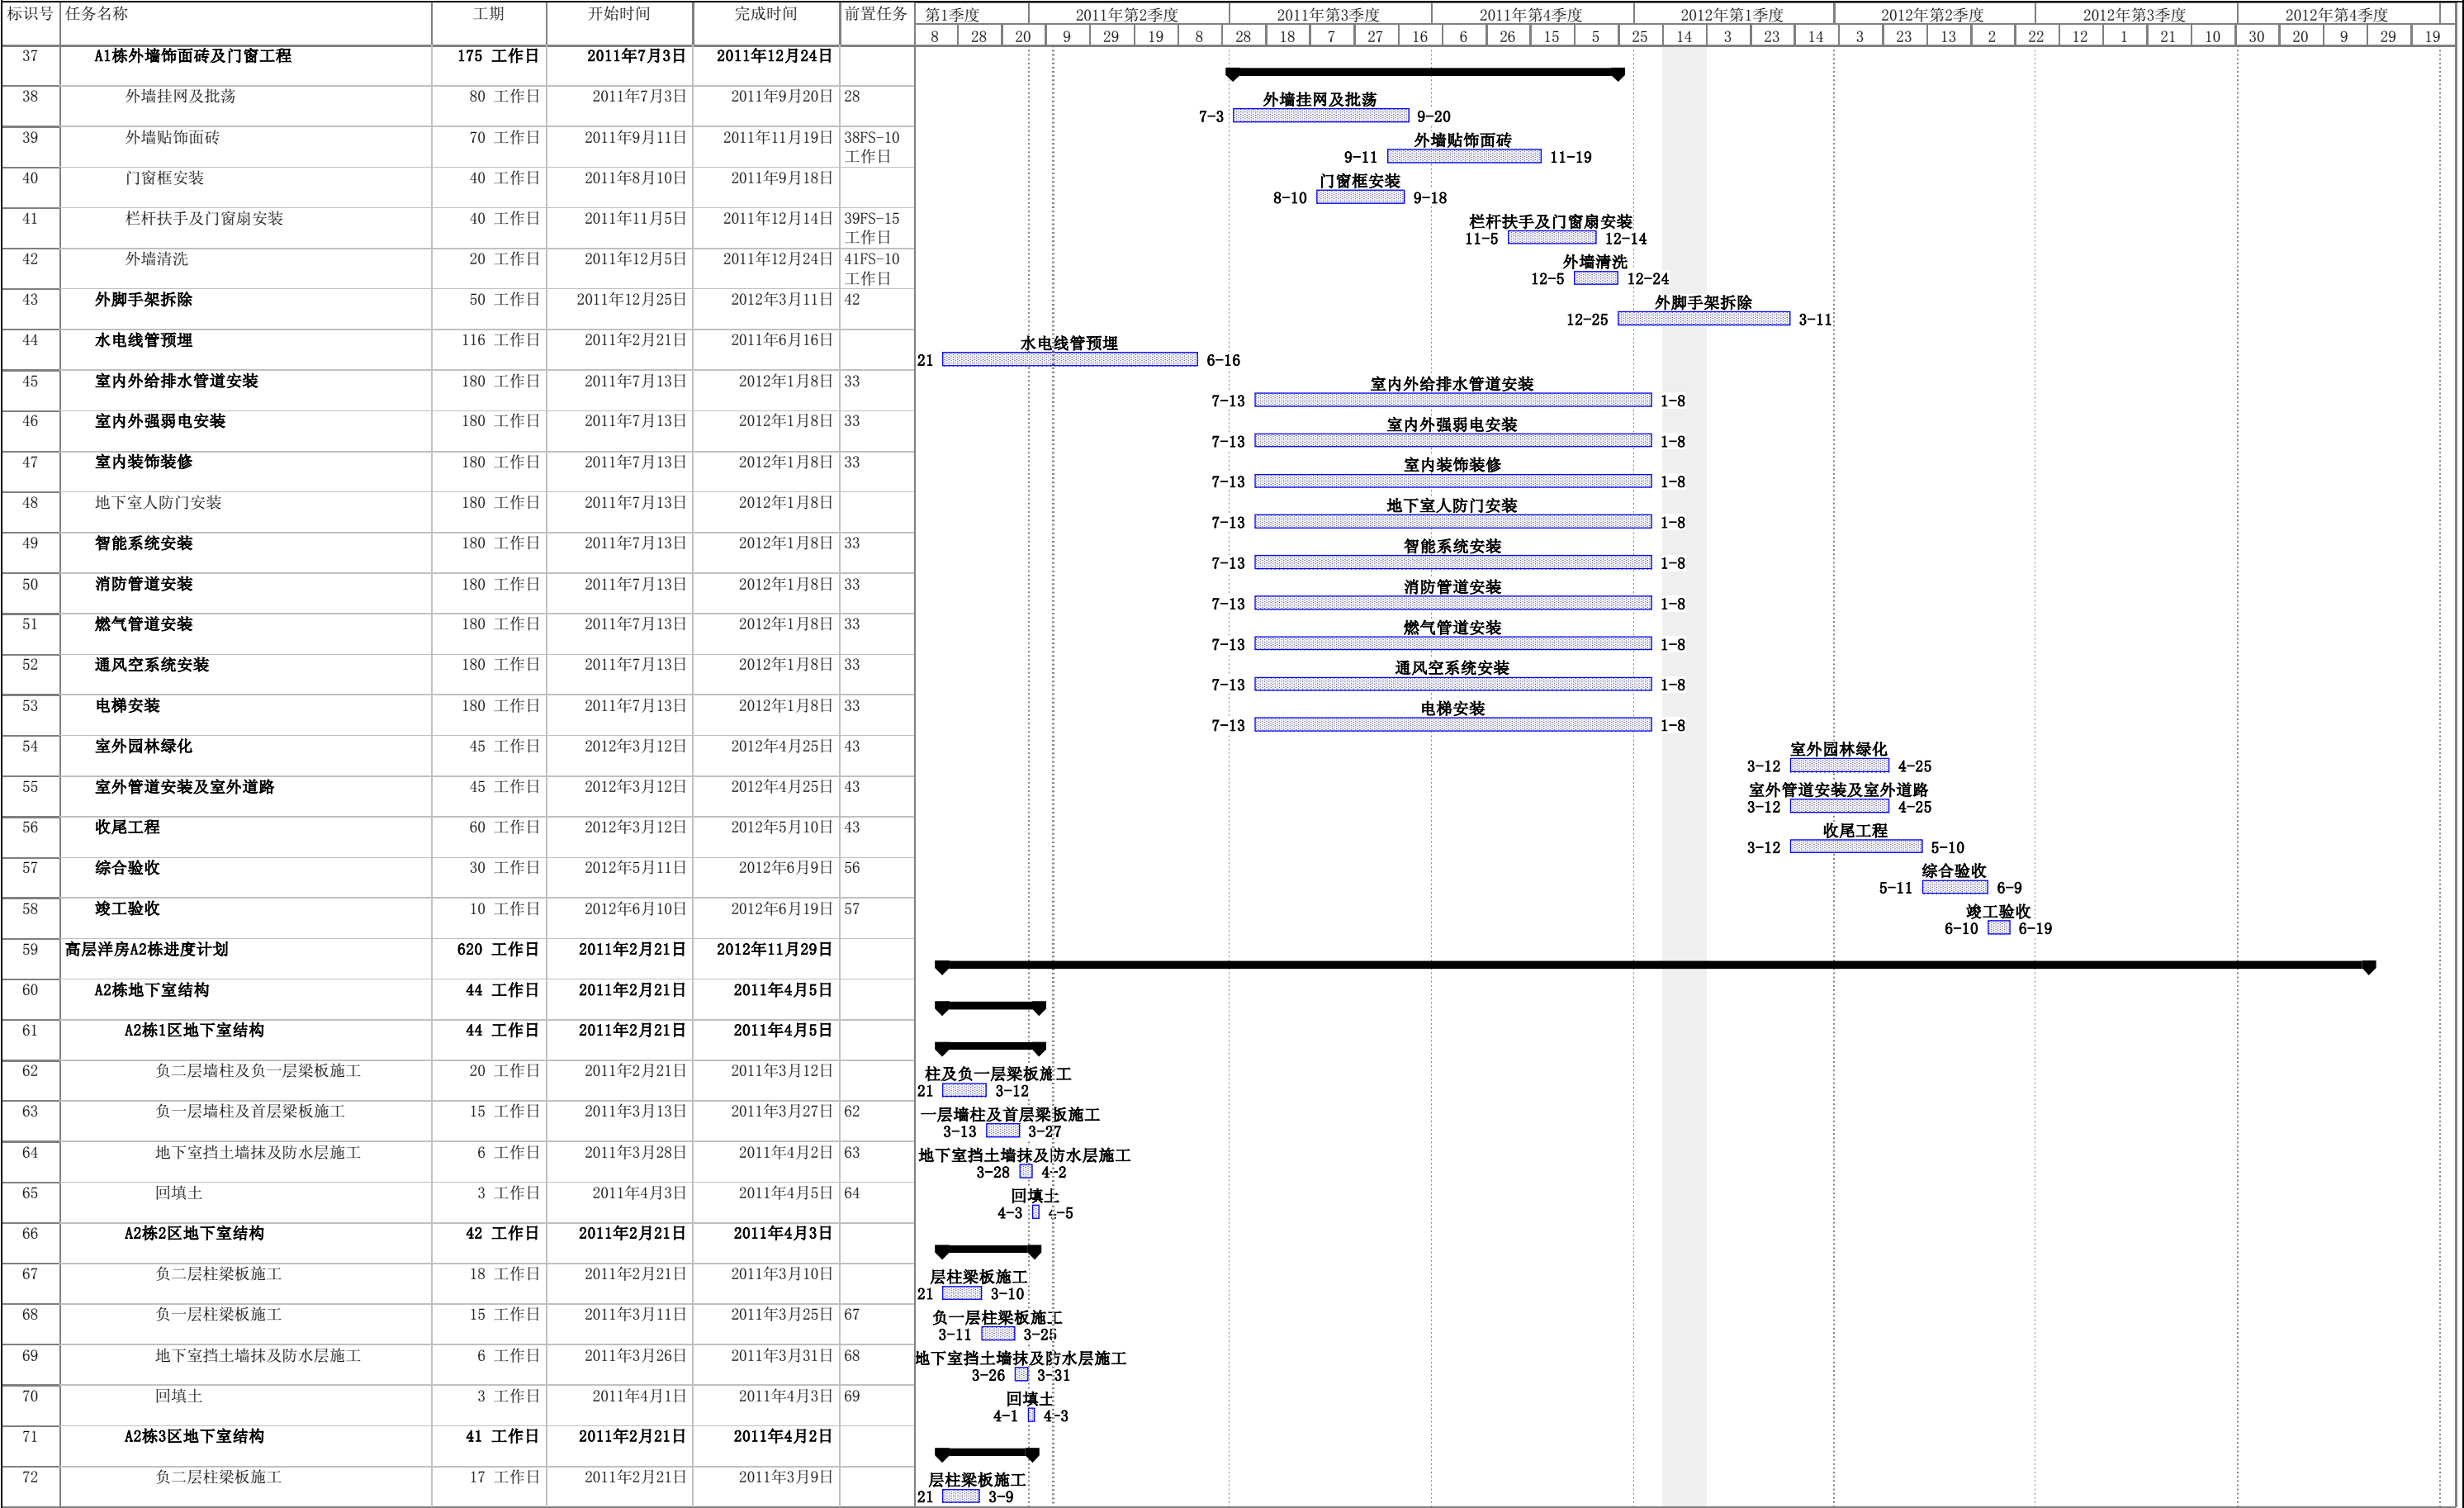




















标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	第1季度				2011年第2季度				2011年第3季度				2011年第4季度				2012年第1季度				2012年第2季度				2012年第3季度				2012年第4季度			
						8	28	20	9	29	19	8	28	18	7	27	16	6	26	15	5	25	14	3	23	14	3	23	13	2	22	12	1	21	10	30	20
1	高层洋房A1栋施工进度计划	457 工作日	2011年2月21日	2012年6月19日		<div></div>																															
2	A1栋主体结构	116 工作日	2011年2月21日	2011年6月16日		<div></div>																															
3	六层剪力墙及七层梁板施工	7 工作日	2011年2月21日	2011年2月27日		墙及七层梁板施工 21 <div></div> 2-27																															
4	七层剪力墙及八层梁板施工	7 工作日	2011年2月28日	2011年3月6日	3	力墙及八层梁板施工 2-28 <div></div> 3-6																															
5	八层剪力墙及九层梁板施工	6 工作日	2011年3月7日	2011年3月12日	4	剪力墙及九层梁板施工 3-7 <div></div> 3-12																															
6	九层剪力墙及十层梁板施工	6 工作日	2011年3月13日	2011年3月18日	5	剪力墙及十层梁板施工 3-13 <div></div> 3-18																															
7	十层剪力墙及十一层梁板施工	6 工作日	2011年3月19日	2011年3月24日	6	层剪力墙及十一层梁板施工 3-19 <div></div> 3-24																															
8	十一层剪力墙及十二层梁板施工	6 工作日	2011年3月25日	2011年3月30日	7	一层剪力墙及十二层梁板施工 3-25 <div></div> 3-30																															
9	十二层剪力墙及十三层梁板施工	6 工作日	2011年3月31日	2011年4月5日	8	十二层剪力墙及十三层梁板施工 3-31 <div></div> 4-5																															
10	十三层剪力墙及十四层梁板施工	6 工作日	2011年4月6日	2011年4月11日	9	十三层剪力墙及十四层梁板施工 4-6 <div></div> 4-11																															
11	十四层剪力墙及十五层梁板施工	6 工作日	2011年4月12日	2011年4月17日	10	十四层剪力墙及十五层梁板施工 4-12 <div></div> 4-17																															
12	十五层剪力墙及十六层梁板施工(销售节点)	6 工作日	2011年4月18日	2011年4月23日	11	十五层剪力墙及十六层梁板施工(销售节点) 4-18 <div></div> 4-23																															
13	十六层剪力墙及十七层梁板施工	6 工作日	2011年4月24日	2011年4月29日	12	十六层剪力墙及十七层梁板施工 4-24 <div></div> 4-29																															
14	十七层剪力墙及十八层梁板施工	6 工作日	2011年4月30日	2011年5月5日	13	十七层剪力墙及十八层梁板施工 4-30 <div></div> 5-5																															
15	十八层剪力墙及十九层梁板施工	6 工作日	2011年5月6日	2011年5月11日	14	十八层剪力墙及十九层梁板施工 5-6 <div></div> 5-11																															
16	十九层剪力墙及二十层梁板施工	6 工作日	2011年5月12日	2011年5月17日	15	十九层剪力墙及二十层梁板施工 5-12 <div></div> 5-17																															
17	二十层剪力墙及二十一层梁板施工	6 工作日	2011年5月18日	2011年5月23日	16	二十层剪力墙及二十一层梁板施工 5-18 <div></div> 5-23																															
18	二十一层剪力墙及二十二层梁板施工	6 工作日	2011年5月24日	2011年5月29日	17	二十一层剪力墙及二十二层梁板施工 5-24 <div></div> 5-29																															
19	二十二层剪力墙及二十三层梁板施工	6 工作日	2011年5月30日	2011年6月4日	18	二十二层剪力墙及二十三层梁板施工 5-30 <div></div> 6-4																															
20	二十三层剪力墙及天面层梁板施工	6 工作日	2011年6月5日	2011年6月10日	19	二十三层剪力墙及天面层梁板施工 6-5 <div></div> 6-10																															
21	天面层柱梁板施工	6 工作日	2011年6月11日	2011年6月16日	20	天面层柱梁板施工 6-11 <div></div> 6-16																															
22	A1栋外脚手架搭设工程	116 工作日	2011年2月21日	2011年6月16日		<div></div>																															
23	外脚手架搭设	116 工作日	2011年2月21日	2011年6月16日		21 <div></div> 6-16																															
24	A1栋砌体工程	120 工作日	2011年3月5日	2011年7月2日		<div></div>																															
25	首~六层砌体	30 工作日	2011年3月5日	2011年4月3日		首~六层砌体 3-5 <div></div> 4-3																															
26	七~十二层砌体	30 工作日	2011年4月4日	2011年5月3日	25	七~十二层砌体 4-4 <div></div> 5-3																															
27	十三~十八层砌体	30 工作日	2011年5月4日	2011年6月2日	26	十三~十八层砌体 5-4 <div></div> 6-2																															
28	十九~天面层砌体	30 工作日	2011年6月3日	2011年7月2日	27	十九~天面层砌体 6-3 <div></div> 7-2																															
29	A1栋抹灰工程	120 工作日	2011年3月15日	2011年7月12日		<div></div>																															
30	首~六层室内抹灰	30 工作日	2011年3月15日	2011年4月13日	25FS-20 工作日	首~六层室内抹灰 3-15 <div></div> 4-13																															
31	七~十二层抹灰	30 工作日	2011年4月14日	2011年5月13日	30	七~十二层抹灰 4-14 <div></div> 5-13																															
32	十三~十八层抹灰	30 工作日	2011年5月14日	2011年6月12日	31	十三~十八层抹灰 5-14 <div></div> 6-12																															
33	十九~天面层抹灰	30 工作日	2011年6月13日	2011年7月12日	32	十九~天面层抹灰 6-13 <div></div> 7-12																															
34	A1 栋屋面工程	75 工作日	2011年6月27日	2011年9月9日		<div></div>																															
35	屋面钢结构施工	45 工作日	2011年6月27日	2011年8月10日	21FS+10 工作日	屋面钢结构施工 6-27 <div></div> 8-10																															
36	屋找平、防水、保护及隔热层	30 工作日	2011年8月11日	2011年9月9日	35	屋找平、防水、保护及隔热层 8-11 <div></div> 9-9																															

项目: 保利东江首府一标A1~A4栋
 日期: 2011年3月1日

保利东江首府一期高层洋房A1~A4栋施工总进度计划




保利东江首府一期高层洋房A1~A4栋施工总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	第1季度			2011年第2季度				2011年第3季度				2011年第4季度				2012年第1季度				2012年第2季度				2012年第3季度				2012年第4季度								
						8	28	20	9	29	19	8	28	18	7	27	16	6	26	15	5	25	14	3	23	14	3	23	13	2	22	12	1	21	10	30	20	9	29	19	
73	负一层柱梁板施工	15 工作日	2011年3月10日	2011年3月24日	72	负一层柱梁板施工 3-10  3-24																																			
74	地下室挡土墙抹及防水层施工	6 工作日	2011年3月25日	2011年3月30日	73	地下室挡土墙抹及防水层施工 3-25  3-30																																			
75	回填土	3 工作日	2011年3月31日	2011年4月2日	74	回填土 3-31  4-2																																			
76	A2栋主体结构	252 工作日	2011年3月28日	2011年12月4日																																					
77	首层剪力墙及二层梁板施工	10 工作日	2011年3月28日	2011年4月6日	63	首层剪力墙及二层梁板施工 3-28  4-6																																			
78	二层剪力墙及三层梁板施工	10 工作日	2011年4月7日	2011年4月16日	77	二层剪力墙及三层梁板施工 4-7  4-16																																			
79	三层剪力墙及四层梁板施工	10 工作日	2011年4月17日	2011年4月26日	78	三层剪力墙及四层梁板施工 4-17  4-26																																			
80	四层剪力墙及五层梁板施工	6 工作日	2011年4月27日	2011年5月2日	79	四层剪力墙及五层梁板施工 4-27  5-2																																			
81	五层剪力墙及六层梁板施工	6 工作日	2011年5月3日	2011年5月8日	80	五层剪力墙及六层梁板施工 5-3  5-8																																			
82	六层剪力墙及七层梁板施工	6 工作日	2011年5月9日	2011年5月14日	81	六层剪力墙及七层梁板施工 5-9  5-14																																			
83	七层剪力墙及八层梁板施工	6 工作日	2011年5月15日	2011年5月20日	82	七层剪力墙及八层梁板施工 5-15  5-20																																			
84	八层剪力墙及九层梁板施工	6 工作日	2011年5月21日	2011年5月26日	83	八层剪力墙及九层梁板施工 5-21  5-26																																			
85	九层剪力墙及十层梁板施工	6 工作日	2011年5月27日	2011年6月1日	84	九层剪力墙及十层梁板施工 5-27  6-1																																			
86	十层剪力墙及十一层梁板施工	6 工作日	2011年6月2日	2011年6月7日	85	十层剪力墙及十一层梁板施工 6-2  6-7																																			
87	十一层剪力墙及十二层梁板施工	6 工作日	2011年6月8日	2011年6月13日	86	十一层剪力墙及十二层梁板施工 6-8  6-13																																			
88	十二层剪力墙及十三层梁板施工	6 工作日	2011年6月14日	2011年6月19日	87	十二层剪力墙及十三层梁板施工 6-14  6-19																																			
89	十三层剪力墙及十四层梁板施工	6 工作日	2011年6月20日	2011年6月25日	88	十三层剪力墙及十四层梁板施工 6-20  6-25																																			
90	十四层剪力墙及十五层梁板施工	6 工作日	2011年6月26日	2011年7月1日	89	十四层剪力墙及十五层梁板施工 6-26  7-1																																			
91	十五层剪力墙及十六层梁板施工	6 工作日	2011年7月2日	2011年7月7日	90	十五层剪力墙及十六层梁板施工 7-2  7-7																																			
92	十六层剪力墙及十七层梁板施工	6 工作日	2011年7月8日	2011年7月13日	91	十六层剪力墙及十七层梁板施工 7-8  7-13																																			
93	十七层剪力墙及十八层梁板施工	6 工作日	2011年7月14日	2011年7月19日	92	十七层剪力墙及十八层梁板施工 7-14  7-19																																			
94	十八层剪力墙及十九层梁板施工	6 工作日	2011年7月20日	2011年7月25日	93	十八层剪力墙及十九层梁板施工 7-20  7-25																																			
95	十九层剪力墙及二十层梁板施工	6 工作日	2011年7月26日	2011年7月31日	94	十九层剪力墙及二十层梁板施工 7-26  7-31																																			
96	二十层剪力墙及二十一层梁板施工	6 工作日	2011年8月1日	2011年8月6日	95	二十层剪力墙及二十一层梁板施工 8-1  8-6																																			
97	二十一层剪力墙及二十二层梁板施工	6 工作日	2011年8月7日	2011年8月12日	96	二十一层剪力墙及二十二层梁板施工 8-7  8-12																																			
98	二十二层剪力墙及二十三层梁板施工	6 工作日	2011年8月13日	2011年8月18日	97	二十二层剪力墙及二十三层梁板施工 8-13  8-18																																			
99	二十三层剪力墙及二十四层梁板施工	6 工作日	2011年8月19日	2011年8月24日	98	二十三层剪力墙及二十四层梁板施工 8-19  8-24																																			
100	二十四层剪力墙及二十五层梁板施工	6 工作日	2011年8月25日	2011年8月30日	99	二十四层剪力墙及二十五层梁板施工 8-25  8-30																																			
101	二十五层剪力墙及二十六层梁板施工(销售节点)	6 工作日	2011年8月31日	2011年9月5日	100	二十五层剪力墙及二十六层梁板施工(销售节点) 8-31  9-5																																			
102	二十六层剪力墙及二十七层梁板施工	6 工作日	2011年9月6日	2011年9月11日	101	二十六层剪力墙及二十七层梁板施工 9-6  9-11																																			
103	二十七层剪力墙及二十八层梁板施工	6 工作日	2011年9月12日	2011年9月17日	102	二十七层剪力墙及二十八层梁板施工 9-12  9-17																																			
104	二十八层剪力墙及二十九层梁板施工	6 工作日	2011年9月18日	2011年9月23日	103	二十八层剪力墙及二十九层梁板施工 9-18  9-23																																			
105	二十九层剪力墙及三十层梁板施工	6 工作日	2011年9月24日	2011年9月29日	104	二十九层剪力墙及三十层梁板施工 9-24  9-29																																			
106	三十层剪力墙及三十一层梁板施工	6 工作日	2011年9月30日	2011年10月5日	105	三十层剪力墙及三十一层梁板施工 9-30  10-5																																			
107	三十一层剪力墙及三十二层梁板施工	6 工作日	2011年10月6日	2011年10月11日	106	三十一层剪力墙及三十二层梁板施工 10-6  10-11																																			
108	三十二层剪力墙及三十三层梁板施工	6 工作日	2011年10月12日	2011年10月17日	107	三十二层剪力墙及三十三层梁板施工 10-12  10-17																																			

项目: 保利东江首府一标A1~A4栋
 日期: 2011年3月1日

保利东江首府一期高层洋房A1~A4栋施工总进度计划

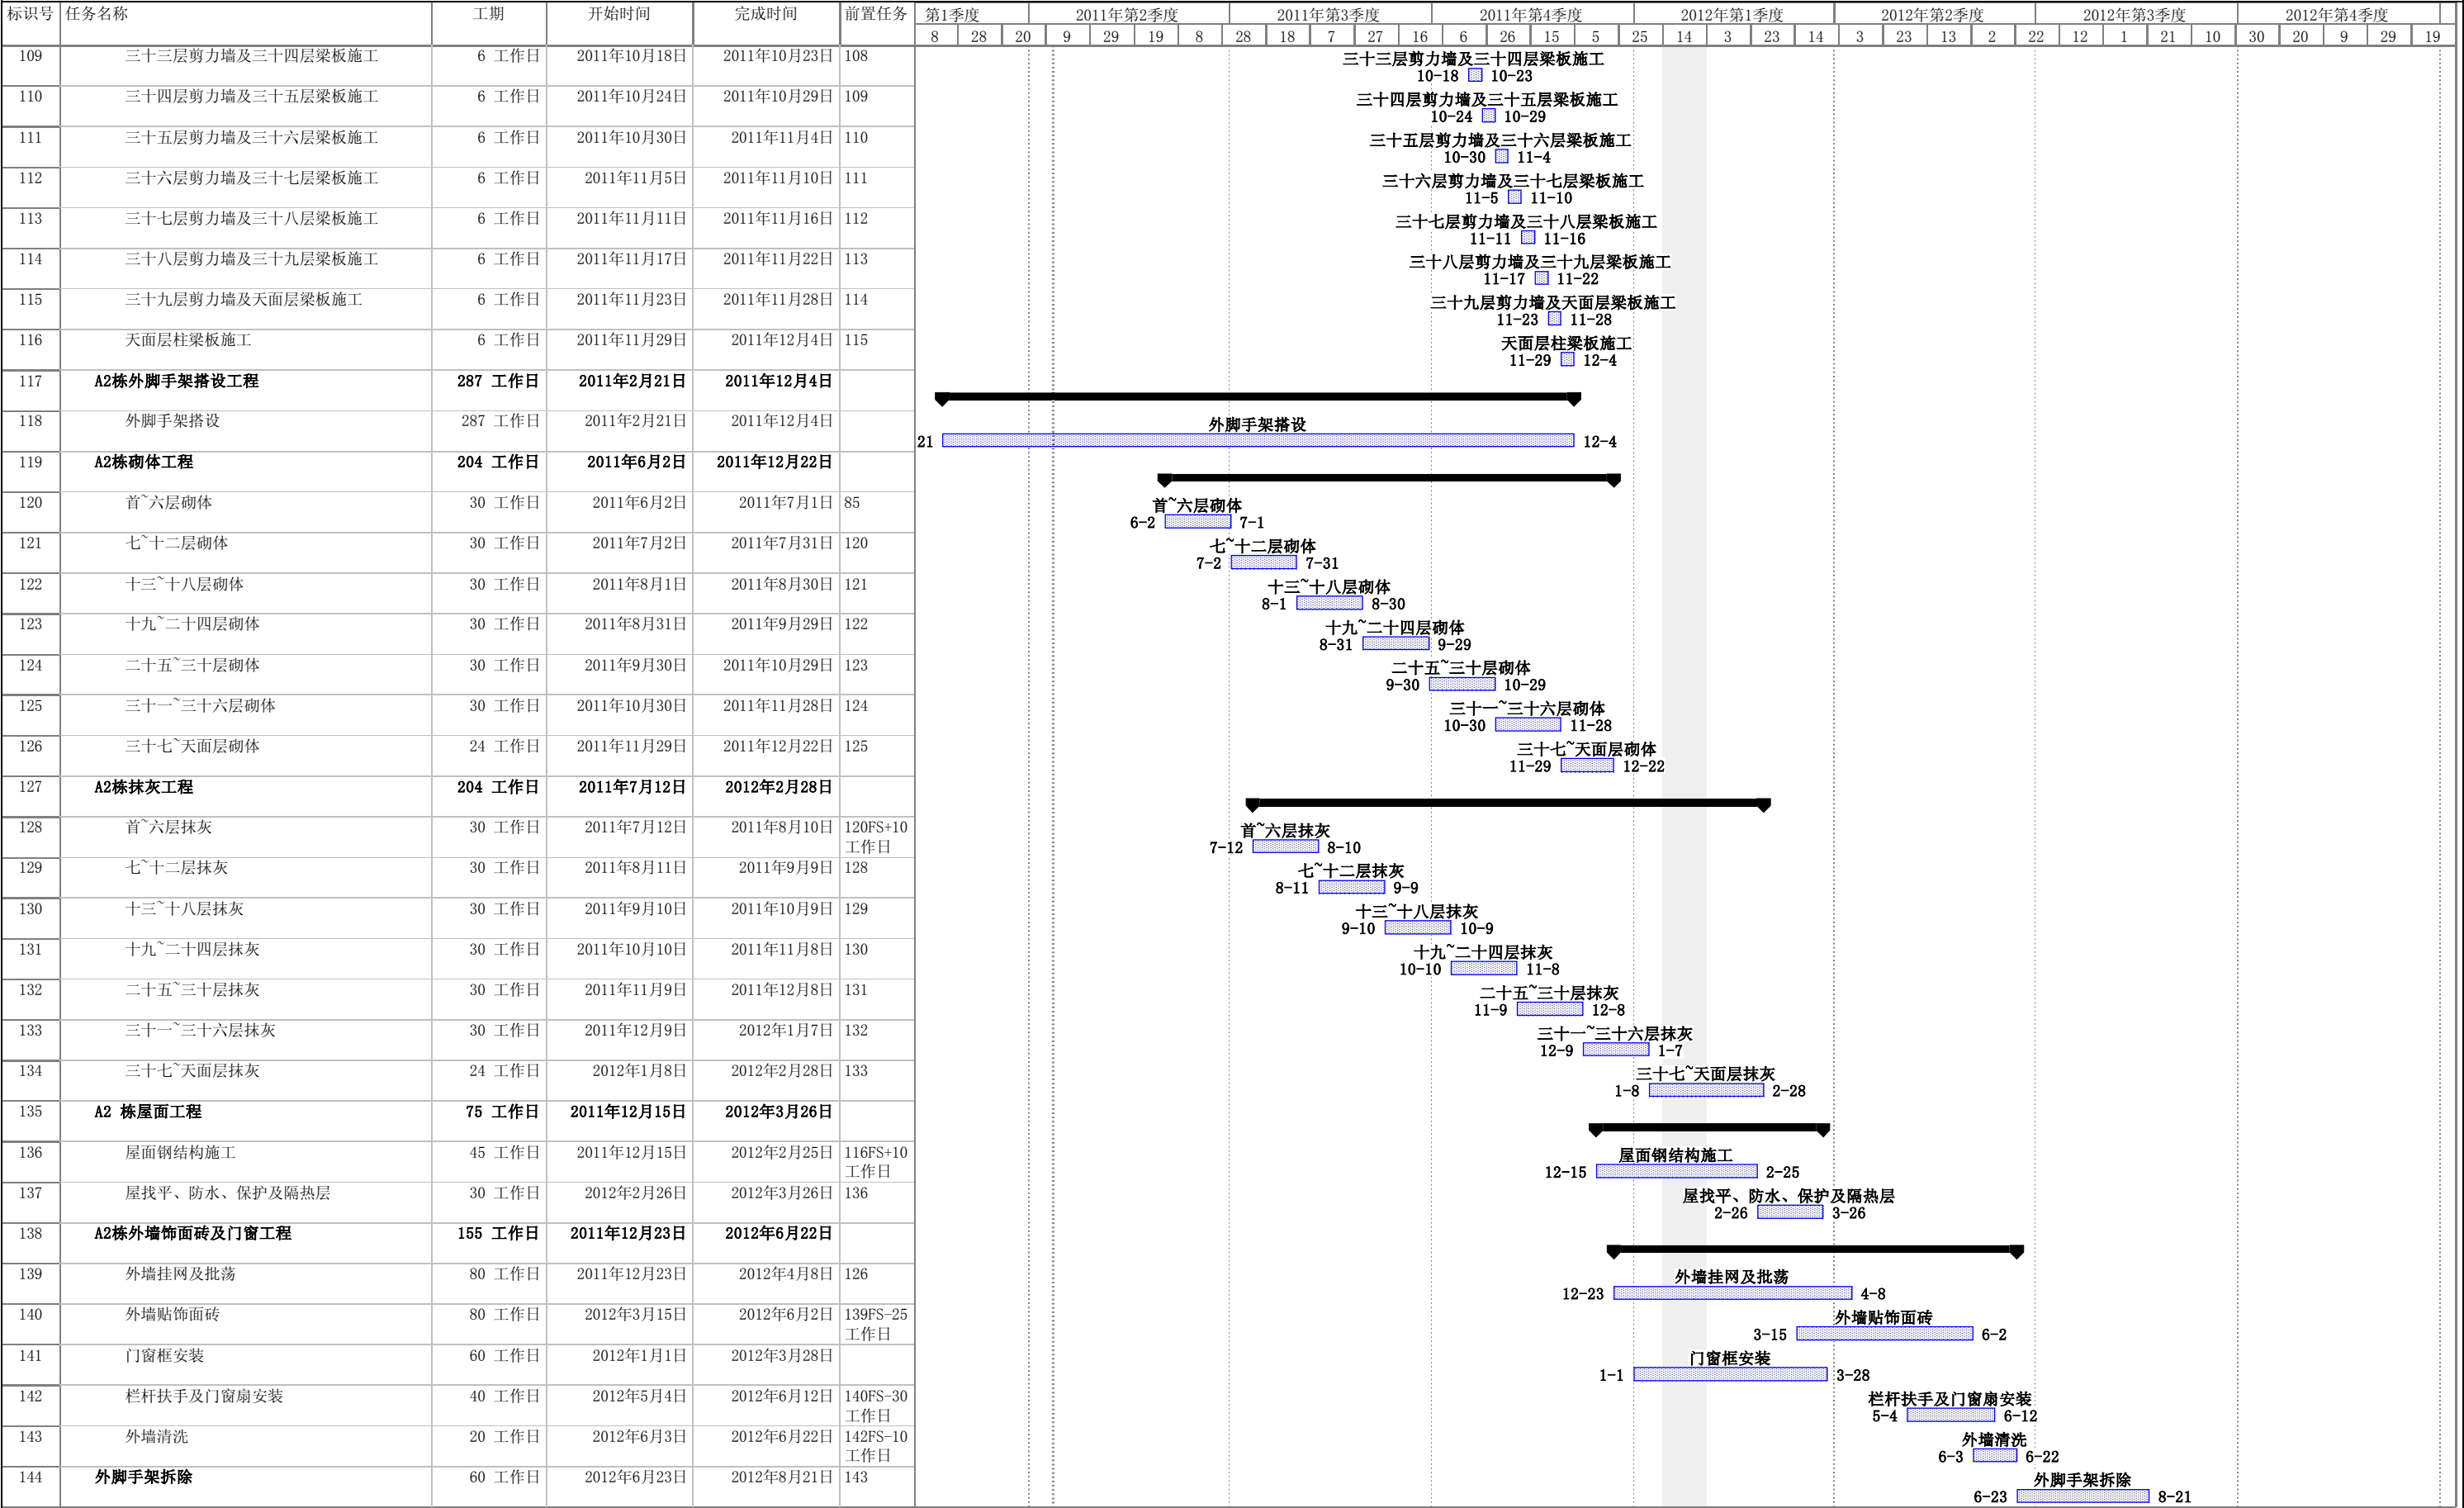


保利东江首府一期高层洋房A1~A4栋施工总进度计划																																							
标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	第1季度			2011年第2季度			2011年第3季度			2011年第4季度			2012年第1季度			2012年第2季度			2012年第3季度			2012年第4季度												
						8	28	20	9	29	19	8	28	18	7	27	16	6	26	15	5	25	14	3	23	14	3	23	13		2	22	12	1	21	10	30	20	9
145	水电线管预埋	252 工作日	2011年2月21日	2011年10月30日		水电线管预埋																																	
146	室内外给排水管道安装	200 工作日	2011年12月23日	2012年8月6日	126																																		
147	室内外强弱电安装	200 工作日	2011年12月23日	2012年8月6日	126																																		
148	室内装饰装修	200 工作日	2011年12月23日	2012年8月6日	126																																		
149	地下室人防门安装	200 工作日	2011年12月23日	2012年8月6日	126																																		
150	智能系统安装	200 工作日	2011年12月23日	2012年8月6日	126																																		
151	消防管道安装	200 工作日	2011年12月23日	2012年8月6日	126																																		
152	燃气管道安装	200 工作日	2011年12月23日	2012年8月6日	126																																		
153	通风空系统安装	200 工作日	2011年12月23日	2012年8月6日	126																																		
154	电梯安装	200 工作日	2011年12月23日	2012年8月6日	126																																		
155	室外园林绿化	45 工作日	2012年8月22日	2012年10月5日	144																																		
156	室外管道安装及室外道路	45 工作日	2012年8月22日	2012年10月5日	144																																		
157	收尾工程	60 工作日	2012年8月22日	2012年10月20日	144																																		
158	综合验收	30 工作日	2012年10月21日	2012年11月19日	157																																		
159	竣工验收	10 工作日	2012年11月20日	2012年11月29日	158																																		
160	高层洋房A3栋进度计划	620 工作日	2011年2月21日	2012年11月29日																																			
161	A3栋地下室结构	44 工作日	2011年2月21日	2011年4月5日																																			
162	A3栋1区地下室结构	44 工作日	2011年2月21日	2011年4月5日																																			
163	负二层墙柱及负一层梁板施工	20 工作日	2011年2月21日	2011年3月12日																																			
164	负一层墙柱及首层梁板施工	15 工作日	2011年3月13日	2011年3月27日	163																																		
165	地下室挡土墙抹及防水层施工	6 工作日	2011年3月28日	2011年4月2日	164																																		
166	回填土	3 工作日	2011年4月3日	2011年4月5日	165																																		
167	A3栋2区地下室结构	44 工作日	2011年2月21日	2011年4月5日																																			
168	负二层墙柱及负一层梁板施工	20 工作日	2011年2月21日	2011年3月12日																																			
169	负一层墙柱及首层梁板施工	15 工作日	2011年3月13日	2011年3月27日	168																																		
170	地下室挡土墙抹及防水层施工	6 工作日	2011年3月28日	2011年4月2日	169																																		
171	回填土	3 工作日	2011年4月3日	2011年4月5日	170																																		
172	A3栋3区地下室结构	39 工作日	2011年2月21日	2011年3月31日																																			
173	负二层墙柱及负一层梁板施工	15 工作日	2011年2月21日	2011年3月7日																																			
174	负一层墙柱及首层梁板施工	15 工作日	2011年3月8日	2011年3月22日	173																																		
175	地下室挡土墙抹及防水层施工	6 工作日	2011年3月23日	2011年3月28日	174																																		
176	回填土	3 工作日	2011年3月29日	2011年3月31日	175																																		
177	A3栋主体结构	252 工作日	2011年3月28日	2011年12月4日																																			
178	首层剪力墙及二层梁板施工	10 工作日	2011年3月28日	2011年4月6日	169																																		
179	二层剪力墙及三层梁板施工	10 工作日	2011年4月7日	2011年4月16日	178																																		
180	三层剪力墙及四层梁板施工	10 工作日	2011年4月17日	2011年4月26日	179																																		

保利东江首府一期高层洋房A1~A4栋施工总进度计划


标序号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	第1季度			2011年第2季度				2011年第3季度				2011年第4季度				2012年第1季度				2012年第2季度				2012年第3季度				2012年第4季度					
						8	28	20	9	29	19	8	28	18	7	27	16	6	26	15	5	25	14	3	23	14	3	23	13	2	22	12	1	21	10	30	20	9
181	四层剪力墙及五层梁板施工	6 工作日	2011年4月27日	2011年5月2日	180	四层剪力墙及五层梁板施工 4-27 5-2																																
182	五层剪力墙及六层梁板施工	6 工作日	2011年5月3日	2011年5月8日	181	五层剪力墙及六层梁板施工 5-3 5-8																																
183	六层剪力墙及七层梁板施工	6 工作日	2011年5月9日	2011年5月14日	182	六层剪力墙及七层梁板施工 5-9 5-14																																
184	七层剪力墙及八层梁板施工	6 工作日	2011年5月15日	2011年5月20日	183	七层剪力墙及八层梁板施工 5-15 5-20																																
185	八层剪力墙及九层梁板施工	6 工作日	2011年5月21日	2011年5月26日	184	八层剪力墙及九层梁板施工 5-21 5-26																																
186	九层剪力墙及十层梁板施工	6 工作日	2011年5月27日	2011年6月1日	185	九层剪力墙及十层梁板施工 5-27 6-1																																
187	十层剪力墙及十一层梁板施工	6 工作日	2011年6月2日	2011年6月7日	186	十层剪力墙及十一层梁板施工 6-2 6-7																																
188	十一层剪力墙及十二层梁板施工	6 工作日	2011年6月8日	2011年6月13日	187	十一层剪力墙及十二层梁板施工 6-8 6-13																																
189	十二层剪力墙及十三层梁板施工	6 工作日	2011年6月14日	2011年6月19日	188	十二层剪力墙及十三层梁板施工 6-14 6-19																																
190	十三层剪力墙及十四层梁板施工	6 工作日	2011年6月20日	2011年6月25日	189	十三层剪力墙及十四层梁板施工 6-20 6-25																																
191	十四层剪力墙及十五层梁板施工	6 工作日	2011年6月26日	2011年7月1日	190	十四层剪力墙及十五层梁板施工 6-26 7-1																																
192	十五层剪力墙及十六层梁板施工	6 工作日	2011年7月2日	2011年7月7日	191	十五层剪力墙及十六层梁板施工 7-2 7-7																																
193	十六层剪力墙及十七层梁板施工	6 工作日	2011年7月8日	2011年7月13日	192	十六层剪力墙及十七层梁板施工 7-8 7-13																																
194	十七层剪力墙及十八层梁板施工	6 工作日	2011年7月14日	2011年7月19日	193	十七层剪力墙及十八层梁板施工 7-14 7-19																																
195	十八层剪力墙及十九层梁板施工	6 工作日	2011年7月20日	2011年7月25日	194	十八层剪力墙及十九层梁板施工 7-20 7-25																																
196	十九层剪力墙及二十层梁板施工	6 工作日	2011年7月26日	2011年7月31日	195	十九层剪力墙及二十层梁板施工 7-26 7-31																																
197	二十层剪力墙及二十一层梁板施工	6 工作日	2011年8月1日	2011年8月6日	196	二十层剪力墙及二十一层梁板施工 8-1 8-6																																
198	二十一层剪力墙及二十二层梁板施工	6 工作日	2011年8月7日	2011年8月12日	197	二十一层剪力墙及二十二层梁板施工 8-7 8-12																																
199	二十二层剪力墙及二十三层梁板施工	6 工作日	2011年8月13日	2011年8月18日	198	二十二层剪力墙及二十三层梁板施工 8-13 8-18																																
200	二十三层剪力墙及二十四层梁板施工	6 工作日	2011年8月19日	2011年8月24日	199	二十三层剪力墙及二十四层梁板施工 8-19 8-24																																
201	二十四层剪力墙及二十五层梁板施工	6 工作日	2011年8月25日	2011年8月30日	200	二十四层剪力墙及二十五层梁板施工 8-25 8-30																																
202	二十五层剪力墙及二十六层梁板施工（销售	6 工作日	2011年8月31日	2011年9月5日	201	二十五层剪力墙及二十六层梁板施工（销售节点） 8-31 9-5																																
203	二十六层剪力墙及二十七层梁板施工	6 工作日	2011年9月6日	2011年9月11日	202	二十六层剪力墙及二十七层梁板施工 9-6 9-11																																
204	二十七层剪力墙及二十八层梁板施工	6 工作日	2011年9月12日	2011年9月17日	203	二十七层剪力墙及二十八层梁板施工 9-12 9-17																																
205	二十八层剪力墙及二十九层梁板施工	6 工作日	2011年9月18日	2011年9月23日	204	二十八层剪力墙及二十九层梁板施工 9-18 9-23																																
206	二十九层剪力墙及三十层梁板施工	6 工作日	2011年9月24日	2011年9月29日	205	二十九层剪力墙及三十层梁板施工 9-24 9-29																																
207	三十层剪力墙及三十一层梁板施工	6 工作日	2011年9月30日	2011年10月5日	206	三十层剪力墙及三十一层梁板施工 9-30 10-5																																
208	三十一层剪力墙及三十二层梁板施工	6 工作日	2011年10月6日	2011年10月11日	207	三十一层剪力墙及三十二层梁板施工 10-6 10-11																																
209	三十二层剪力墙及三十三层梁板施工	6 工作日	2011年10月12日	2011年10月17日	208	三十二层剪力墙及三十三层梁板施工 10-12 10-17																																
210	三十三层剪力墙及三十四层梁板施工	6 工作日	2011年10月18日	2011年10月23日	209	三十三层剪力墙及三十四层梁板施工 10-18 10-23																																
211	三十四层剪力墙及三十五层梁板施工	6 工作日	2011年10月24日	2011年10月29日	210	三十四层剪力墙及三十五层梁板施工 10-24 10-29																																
212	三十五层剪力墙及三十六层梁板施工	6 工作日	2011年10月30日	2011年11月4日	211	三十五层剪力墙及三十六层梁板施工 10-30 11-4																																
213	三十六层剪力墙及三十七层梁板施工	6 工作日	2011年11月5日	2011年11月10日	212	三十六层剪力墙及三十七层梁板施工 11-5 11-10																																
214	三十七层剪力墙及三十八层梁板施工	6 工作日	2011年11月11日	2011年11月16日	213	三十七层剪力墙及三十八层梁板施工 11-11 11-16																																
215	三十八层剪力墙及三十九层梁板施工	6 工作日	2011年11月17日	2011年11月22日	214	三十八层剪力墙及三十九层梁板施工 11-17 11-22																																
216	三十九层剪力墙及天面层梁板施工	6 工作日	2011年11月23日	2011年11月28日	215	三十九层剪力墙及天面层梁板施工 11-23 11-28																																

项目: 保利东江首府一标A1~A4栋 日期: 2011年3月1日	任务  拆分  进度  里程碑  摘要  项目摘要  外部任务  外部里程碑  期限 
-------------------------------------	---

保利东江首府一期高层洋房A1~A4栋施工总进度计划

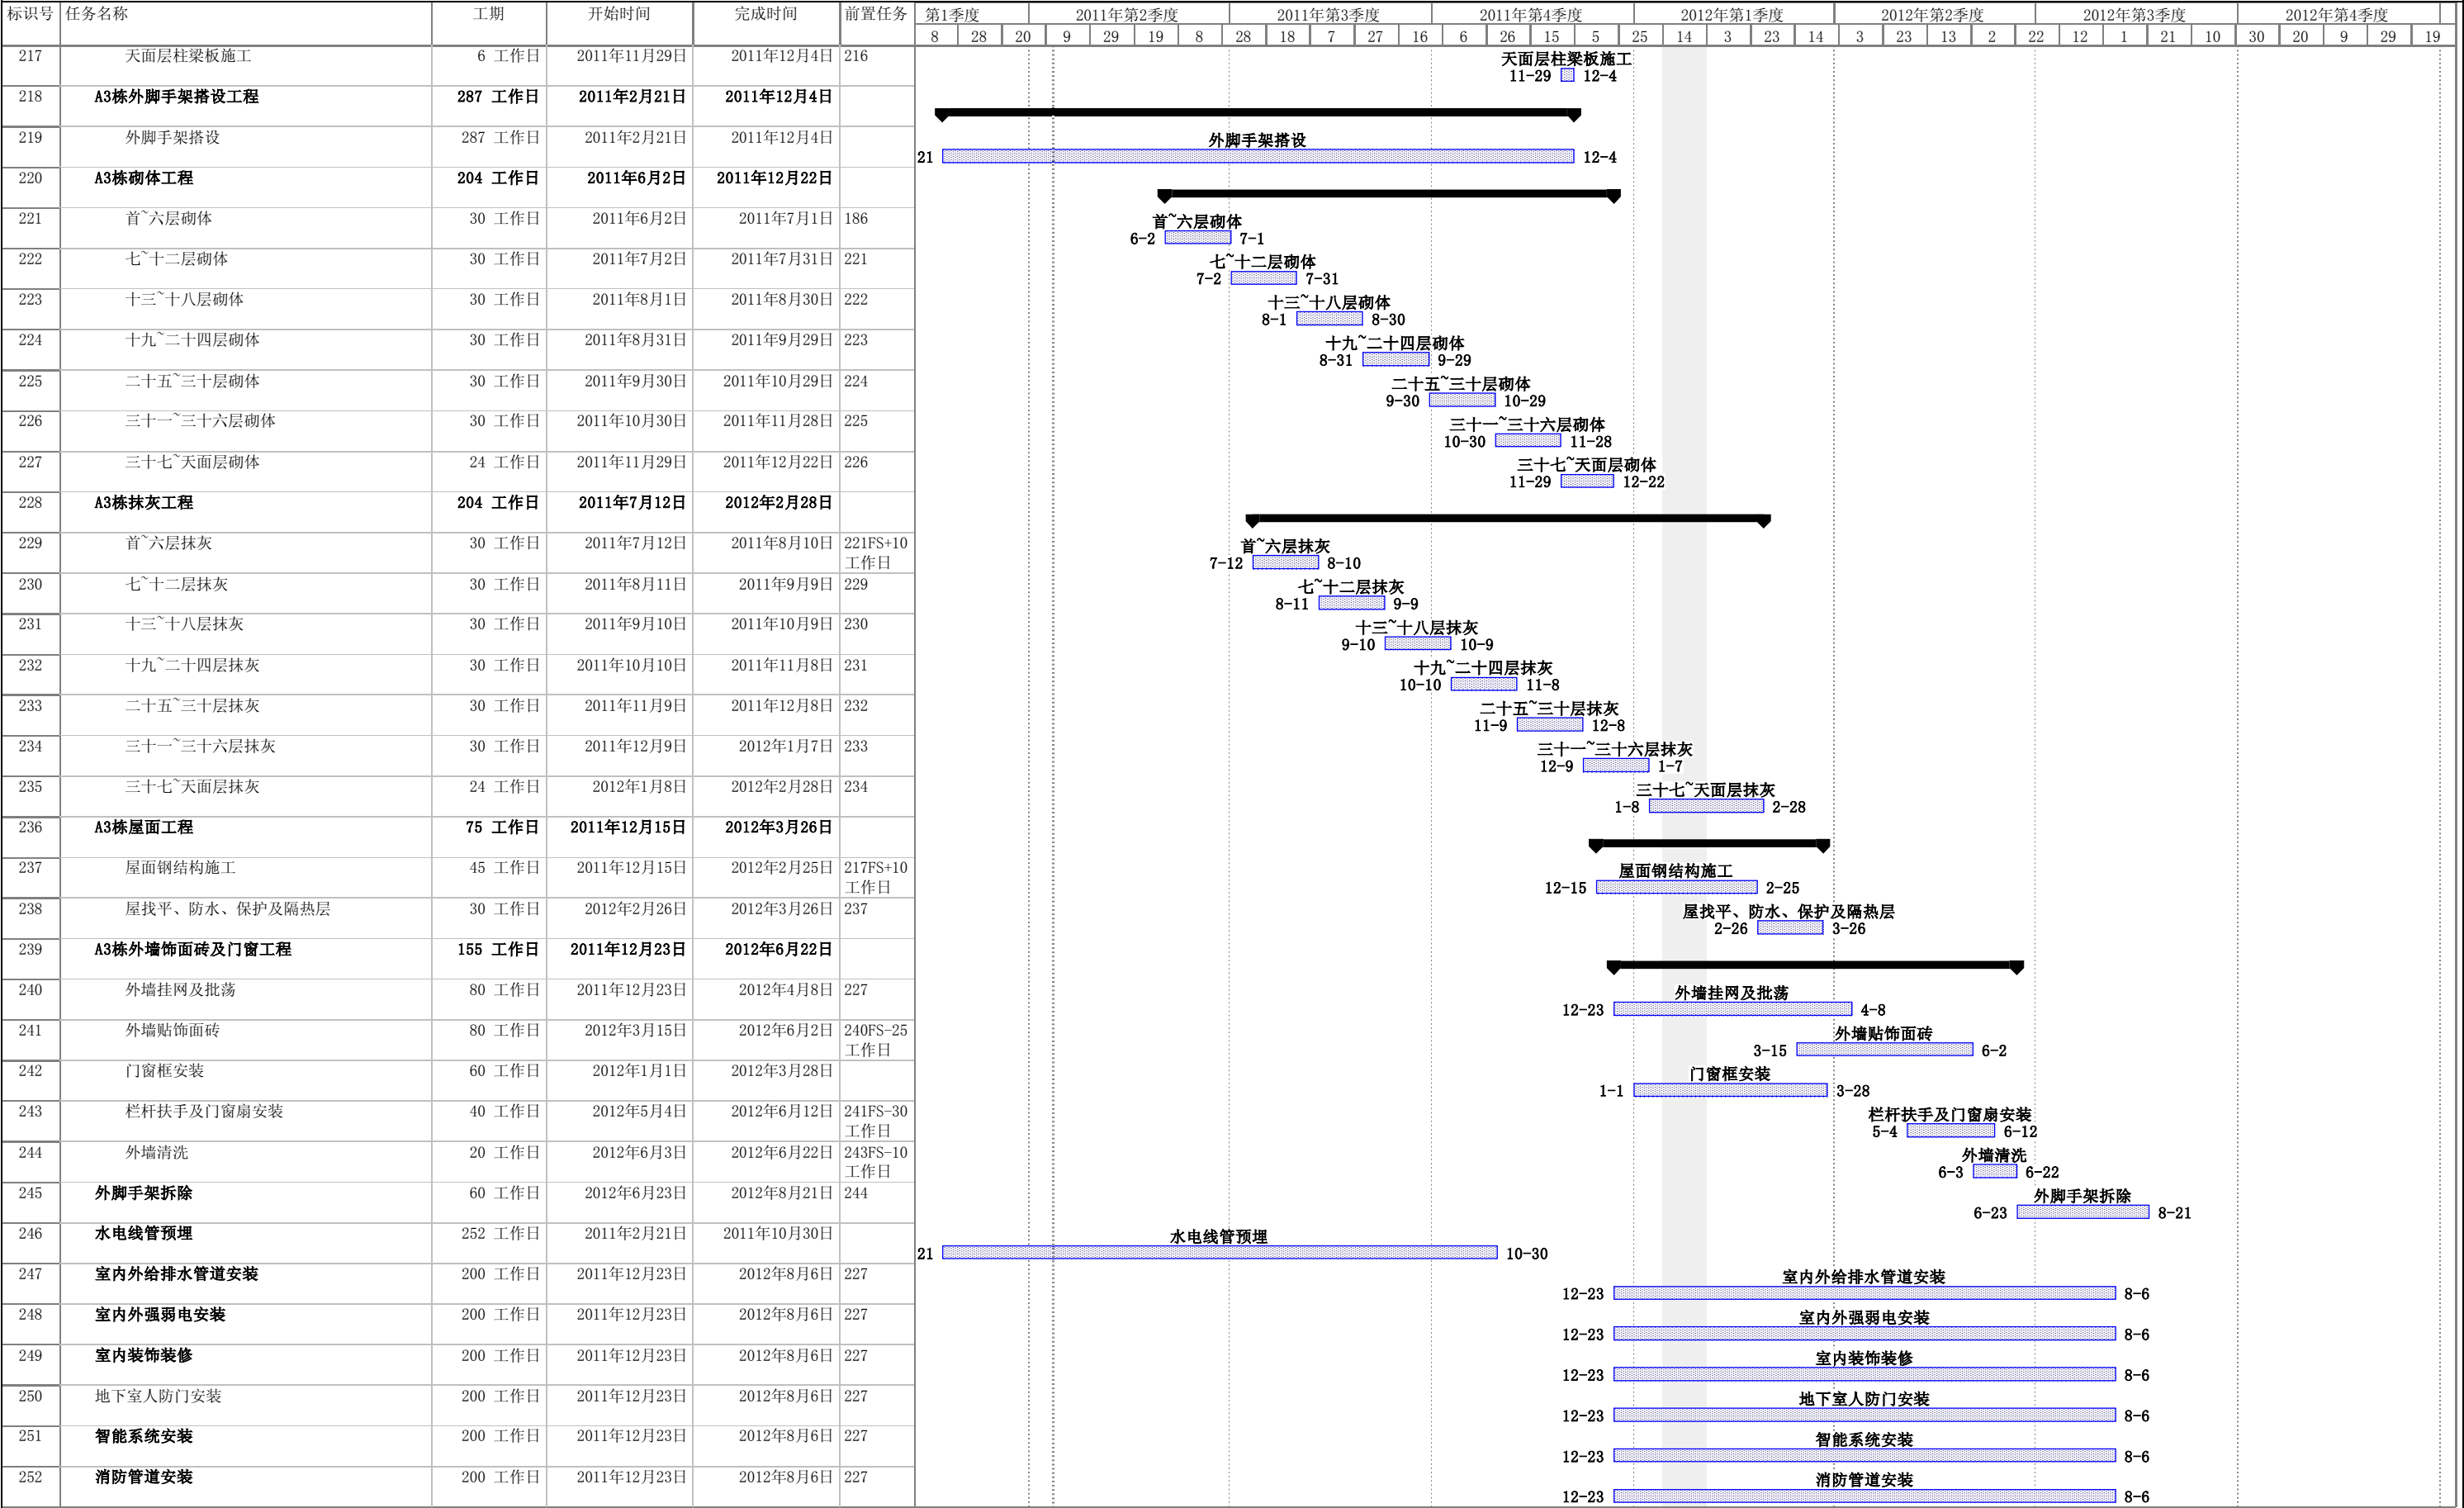

保利东江首府一期高层洋房A1~A4栋施工总进度计划

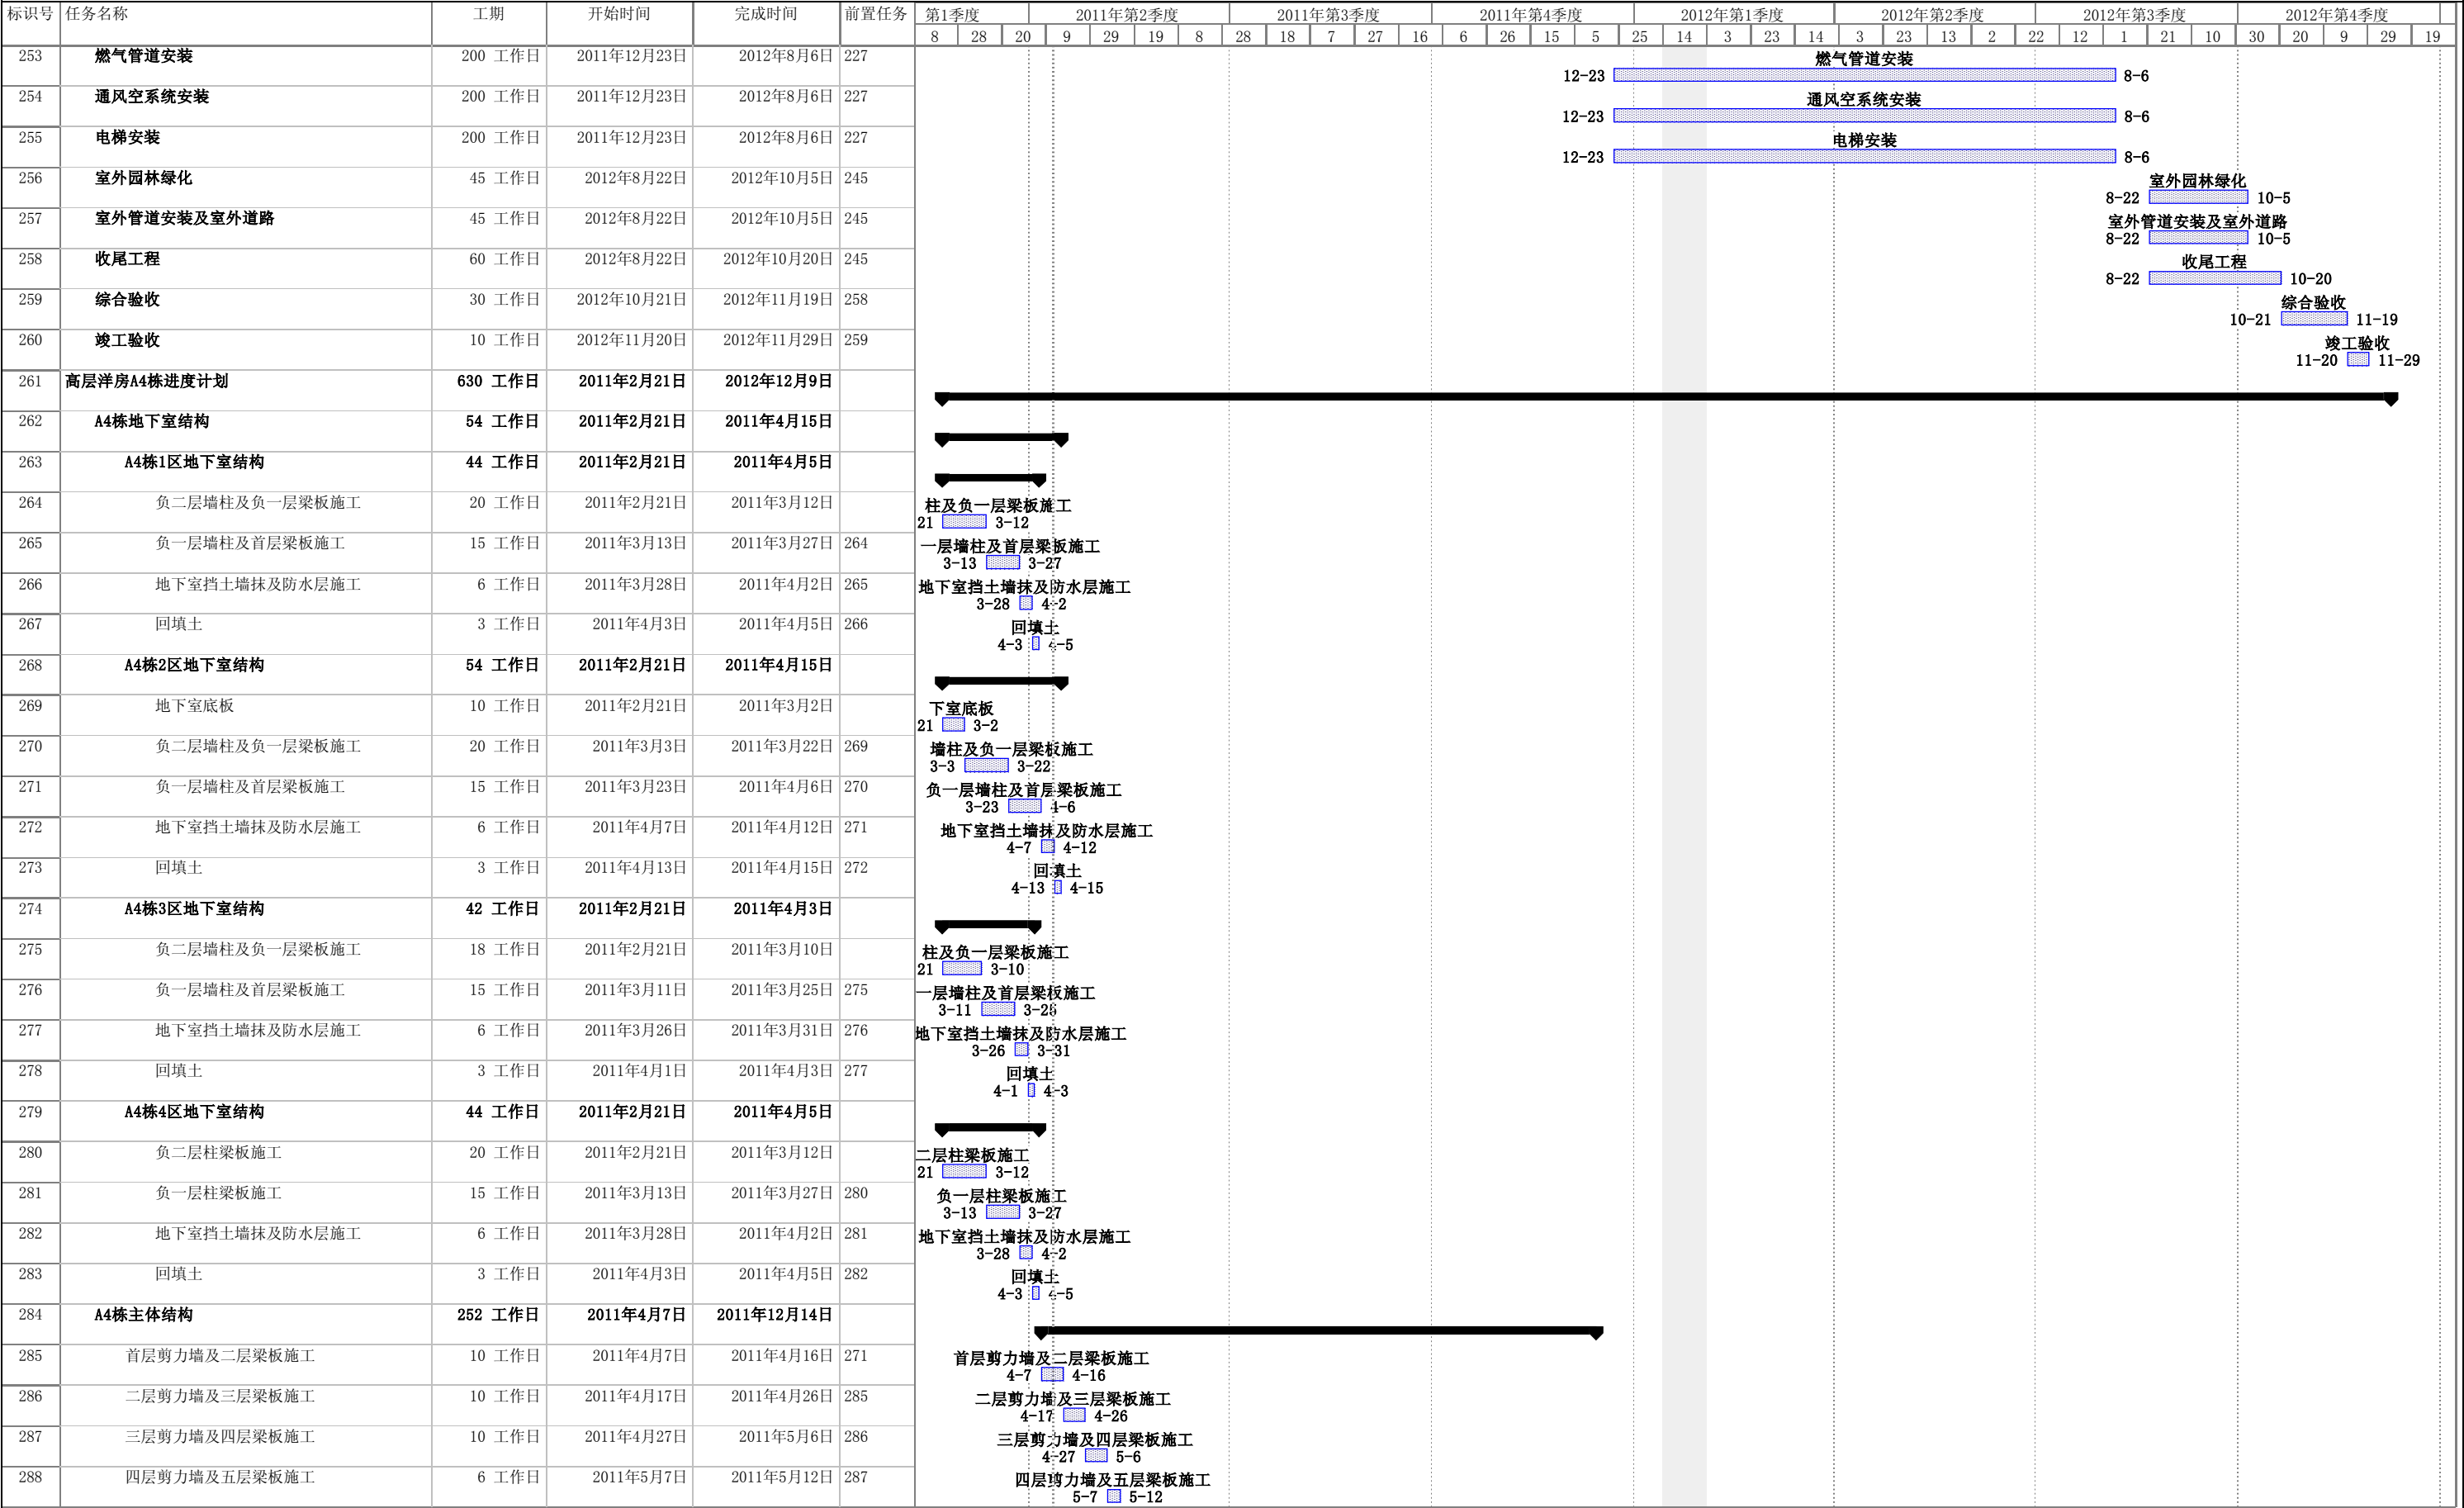


保利东江首府一期高层洋房A1~A4栋施工总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	第1季度			2011年第2季度				2011年第3季度				2011年第4季度				2012年第1季度				2012年第2季度				2012年第3季度				2012年第4季度				
						8	28	20	9	29	19	8	28	18	7	27	16	6	26	15	5	25	14	3	23	14	3	23	13	2	22	12	1	21	10	30	20
289	五层剪力墙及六层梁板施工	6 工作日	2011年5月13日	2011年5月18日	288	五层剪力墙及六层梁板施工 5-13 5-18																															
290	六层剪力墙及七层梁板施工	6 工作日	2011年5月19日	2011年5月24日	289	六层剪力墙及七层梁板施工 5-19 5-24																															
291	七层剪力墙及八层梁板施工	6 工作日	2011年5月25日	2011年5月30日	290	七层剪力墙及八层梁板施工 5-25 5-30																															
292	八层剪力墙及九层梁板施工	6 工作日	2011年5月31日	2011年6月5日	291	八层剪力墙及九层梁板施工 5-31 6-5																															
293	九层剪力墙及十层梁板施工	6 工作日	2011年6月6日	2011年6月11日	292	九层剪力墙及十层梁板施工 6-6 6-11																															
294	十层剪力墙及十一层梁板施工	6 工作日	2011年6月12日	2011年6月17日	293	十层剪力墙及十一层梁板施工 6-12 6-17																															
295	十一层剪力墙及十二层梁板施工	6 工作日	2011年6月18日	2011年6月23日	294	十一层剪力墙及十二层梁板施工 6-18 6-23																															
296	十二层剪力墙及十三层梁板施工	6 工作日	2011年6月24日	2011年6月29日	295	十二层剪力墙及十三层梁板施工 6-24 6-29																															
297	十三层剪力墙及十四层梁板施工	6 工作日	2011年6月30日	2011年7月5日	296	十三层剪力墙及十四层梁板施工 6-30 7-5																															
298	十四层剪力墙及十五层梁板施工	6 工作日	2011年7月6日	2011年7月11日	297	十四层剪力墙及十五层梁板施工 7-6 7-11																															
299	十五层剪力墙及十六层梁板施工	6 工作日	2011年7月12日	2011年7月17日	298	十五层剪力墙及十六层梁板施工 7-12 7-17																															
300	十六层剪力墙及十七层梁板施工	6 工作日	2011年7月18日	2011年7月23日	299	十六层剪力墙及十七层梁板施工 7-18 7-23																															
301	十七层剪力墙及十八层梁板施工	6 工作日	2011年7月24日	2011年7月29日	300	十七层剪力墙及十八层梁板施工 7-24 7-29																															
302	十八层剪力墙及十九层梁板施工	6 工作日	2011年7月30日	2011年8月4日	301	十八层剪力墙及十九层梁板施工 7-30 8-4																															
303	十九层剪力墙及二十层梁板施工	6 工作日	2011年8月5日	2011年8月10日	302	十九层剪力墙及二十层梁板施工 8-5 8-10																															
304	二十层剪力墙及二十一层梁板施工	6 工作日	2011年8月11日	2011年8月16日	303	二十层剪力墙及二十一层梁板施工 8-11 8-16																															
305	二十一层剪力墙及二十二层梁板施工	6 工作日	2011年8月17日	2011年8月22日	304	二十一层剪力墙及二十二层梁板施工 8-17 8-22																															
306	二十二层剪力墙及二十三层梁板施工	6 工作日	2011年8月23日	2011年8月28日	305	二十二层剪力墙及二十三层梁板施工 8-23 8-28																															
307	二十三层剪力墙及二十四层梁板施工	6 工作日	2011年8月29日	2011年9月3日	306	二十三层剪力墙及二十四层梁板施工 8-29 9-3																															
308	二十四层剪力墙及二十五层梁板施工	6 工作日	2011年9月4日	2011年9月9日	307	二十四层剪力墙及二十五层梁板施工 9-4 9-9																															
309	二十五层剪力墙及二十六层梁板施工(销售节点)	6 工作日	2011年9月10日	2011年9月15日	308	二十五层剪力墙及二十六层梁板施工(销售节点) 9-10 9-15																															
310	二十六层剪力墙及二十七层梁板施工	6 工作日	2011年9月16日	2011年9月21日	309	二十六层剪力墙及二十七层梁板施工 9-16 9-21																															
311	二十七层剪力墙及二十八层梁板施工	6 工作日	2011年9月22日	2011年9月27日	310	二十七层剪力墙及二十八层梁板施工 9-22 9-27																															
312	二十八层剪力墙及二十九层梁板施工	6 工作日	2011年9月28日	2011年10月3日	311	二十八层剪力墙及二十九层梁板施工 9-28 10-3																															
313	二十九层剪力墙及三十层梁板施工	6 工作日	2011年10月4日	2011年10月9日	312	二十九层剪力墙及三十层梁板施工 10-4 10-9																															
314	三十层剪力墙及三十一层梁板施工	6 工作日	2011年10月10日	2011年10月15日	313	三十层剪力墙及三十一层梁板施工 10-10 10-15																															
315	三十一层剪力墙及三十二层梁板施工	6 工作日	2011年10月16日	2011年10月21日	314	三十一层剪力墙及三十二层梁板施工 10-16 10-21																															
316	三十二层剪力墙及三十三层梁板施工	6 工作日	2011年10月22日	2011年10月27日	315	三十二层剪力墙及三十三层梁板施工 10-22 10-27																															
317	三十三层剪力墙及三十四层梁板施工	6 工作日	2011年10月28日	2011年11月2日	316	三十三层剪力墙及三十四层梁板施工 10-28 11-2																															
318	三十四层剪力墙及三十五层梁板施工	6 工作日	2011年11月3日	2011年11月8日	317	三十四层剪力墙及三十五层梁板施工 11-3 11-8																															
319	三十五层剪力墙及三十六层梁板施工	6 工作日	2011年11月9日	2011年11月14日	318	三十五层剪力墙及三十六层梁板施工 11-9 11-14																															
320	三十六层剪力墙及三十七层梁板施工	6 工作日	2011年11月15日	2011年11月20日	319	三十六层剪力墙及三十七层梁板施工 11-15 11-20																															
321	三十七层剪力墙及三十八层梁板施工	6 工作日	2011年11月21日	2011年11月26日	320	三十七层剪力墙及三十八层梁板施工 11-21 11-26																															
322	三十八层剪力墙及三十九层梁板施工	6 工作日	2011年11月27日	2011年12月2日	321	三十八层剪力墙及三十九层梁板施工 11-27 12-2																															
323	三十九层剪力墙及天面层梁板施工	6 工作日	2011年12月3日	2011年12月8日	322	三十九层剪力墙及天面层梁板施工 12-3 12-8																															
324	天面层柱梁板施工	6 工作日	2011年12月9日	2011年12月14日	323	天面层柱梁板施工 12-9 12-14																															

项目: 保利东江首府一标A1~A4栋 日期: 2011年3月1日	任务  拆分  进度  里程碑  摘要  项目摘要  外部任务  外部里程碑  期限 
-------------------------------------	---

保利东江首府一期高层洋房A1~A4栋施工总进度计划

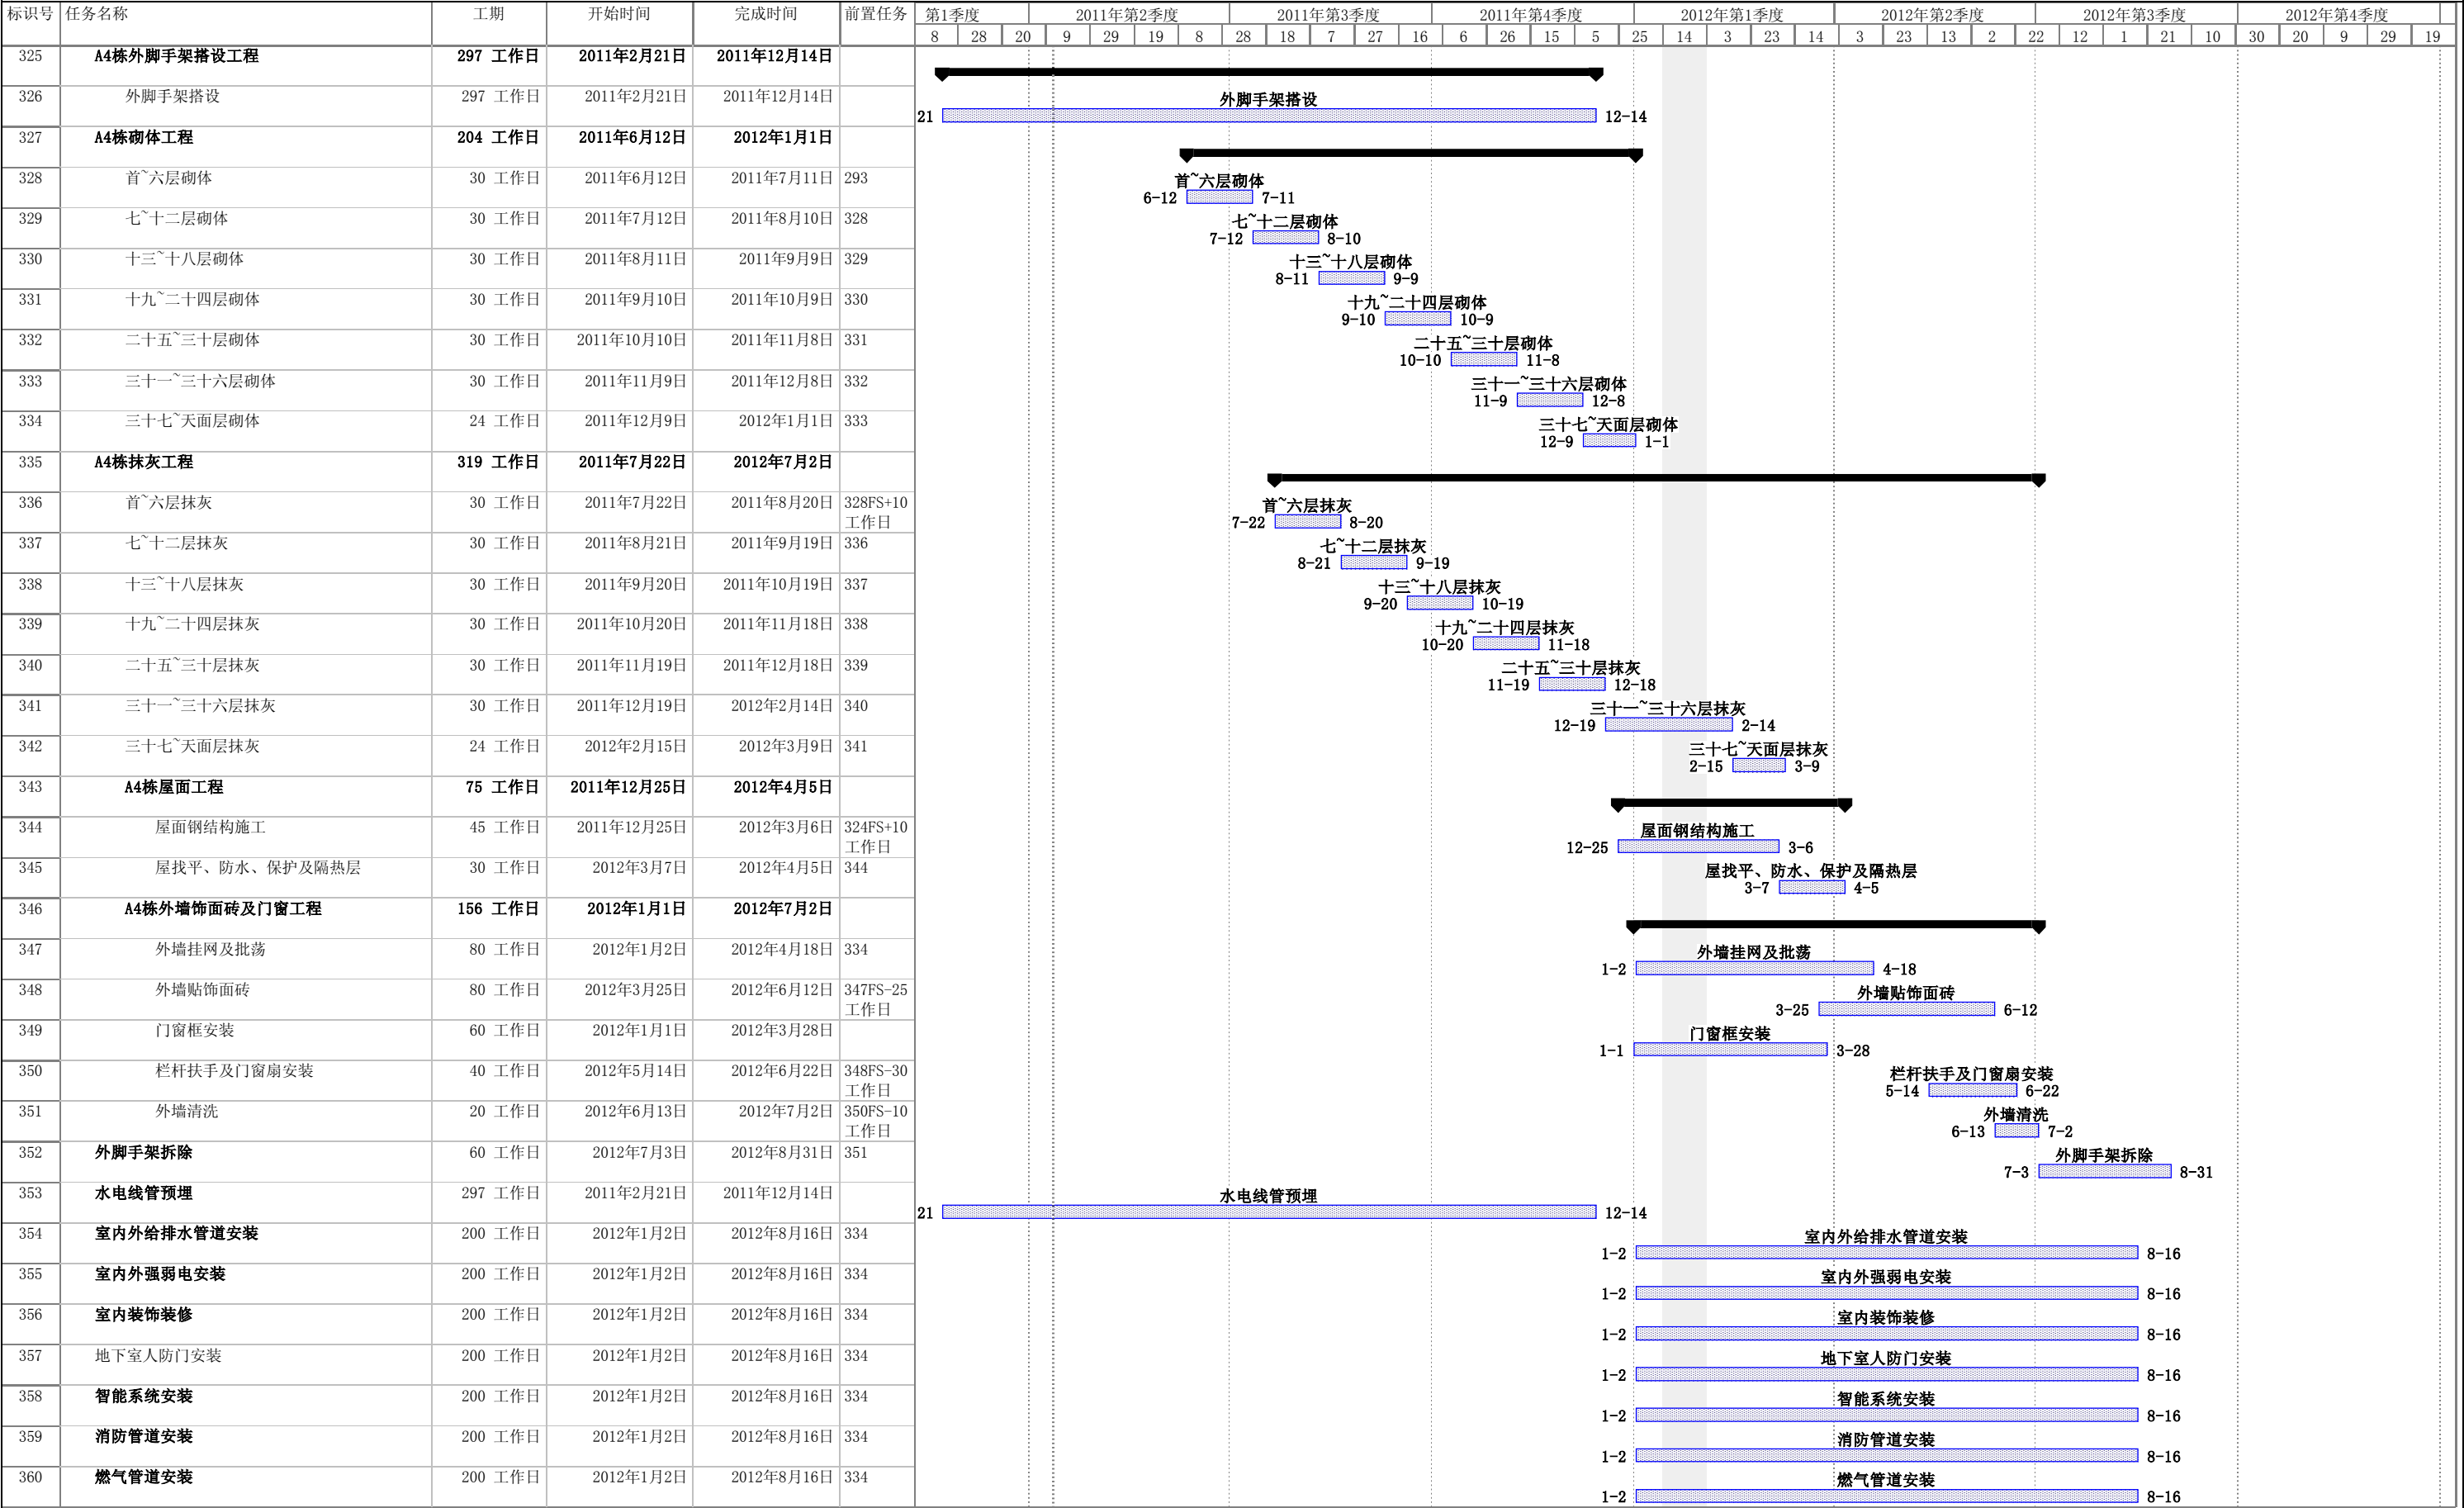

保利东江首府一期高层洋房A1~A4栋施工总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	第1季度			2011年第2季度				2011年第3季度					2011年第4季度					2012年第1季度					2012年第2季度					2012年第3季度					2012年第4季度				
						8	28	20	9	29	19	8	28	18	7	27	16	6	26	15	5	25	14	3	23	14	3	23	13	2	22	12	1	21	10	30	20	9	29	19		
361	通风空系统安装	200 工作日	2012年1月2日	2012年8月16日	334	1-2 通风空系统安装 8-16																																				
362	电梯安装	200 工作日	2012年1月2日	2012年8月16日	334	1-2 电梯安装 8-16																																				
363	室外园林绿化	45 工作日	2012年9月1日	2012年10月15日	352	9-1 室外园林绿化 10-15																																				
364	室外管道安装及室外道路	45 工作日	2012年9月1日	2012年10月15日	352	9-1 室外管道安装及室外道路 10-15																																				
365	收尾工程	60 工作日	2012年9月1日	2012年10月30日	352	9-1 收尾工程 10-30																																				
366	综合验收	30 工作日	2012年10月31日	2012年11月29日	365	10-31 综合验收 11-29																																				
367	竣工验收	10 工作日	2012年11月30日	2012年12月9日	366	11-30 竣工验收 12-9																																				
